รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

****


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๕๕,๘๗๑,๖๐๐ บาท โดยมีวงเงินงบประมาณหลังถูกพิจารณาจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ		**๑๔๔,๔๒๗,๗๐๐**
๑	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด	๗๒,๘๓๓,๗๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๐,๕๗๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๖,๙๑๘,๔๐๐
๔	โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว	๔,๑๐๕,๖๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน		**๑๑,๑๖๐,๐๐๐**
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน	๑๑,๑๖๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		**๑๖๖,๘๐๙,๖๐๐**
๖	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๒๓๔,๐๐๐
๗	โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริสู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๖,๔๔๓,๐๐๐
๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๓๔,๓๒๙,๓๐๐
๙	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๖,๑๐๑,๓๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๖,๑๐๒,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน	๑๑,๖๐๐,๐๐๐

ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		**๑๑,๕๖๑,๐๐๐**
๑๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบบบูรณาการ	๑๑,๕๖๑,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน		**๑๒,๙๑๓,๓๐๐**
๑๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๖๓๓,๓๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเสริมความมั่นคงหมู่บ้านชายแดน	๘,๖๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**๙,๐๐๐,๐๐๐**
รวม		**๓๕๕,๘๗๑,๖๐๐**

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวม ๓๕๕,๘๗๑,๖๐๐ บาท โดยมีวงเงินงบประมาณหลังถูกพิจารณาจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๘.๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๔ อยู่ในลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ

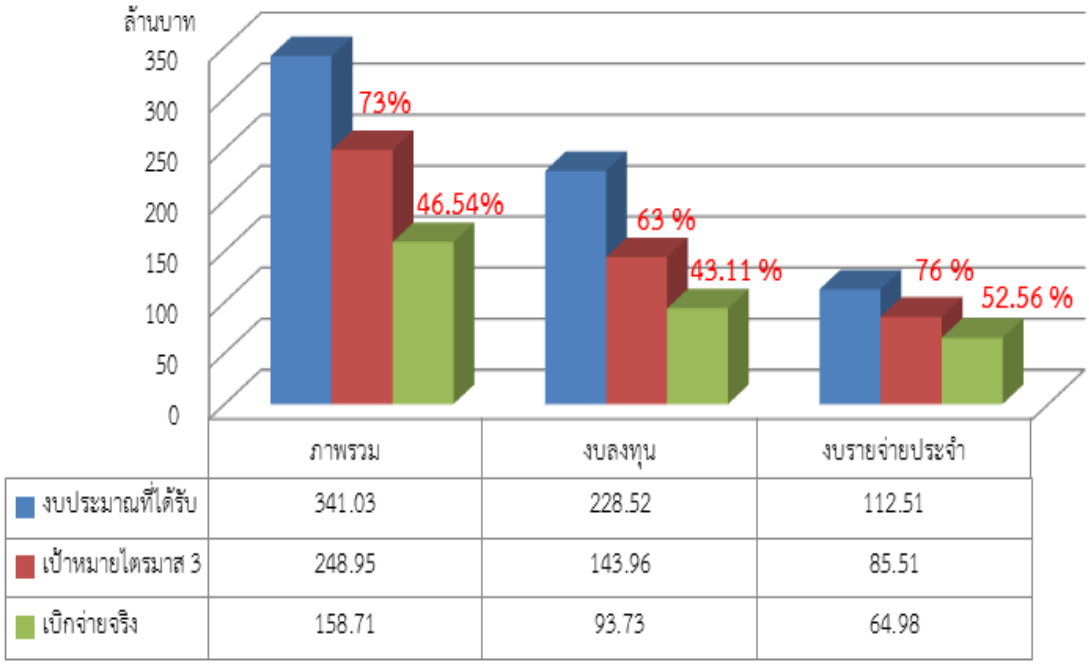

แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายจริง

ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	เป้าหมายไตรมาส ๓ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม	๓๔๑.๐๓	๒๔๘.๙๕	๑๕๘.๗๑	๔๖.๕๔
งบลงทุน	๒๑๗.๓๙	๑๔๓.๙๖	๙๓.๗๓	๔๓.๑๑
งบรายจ่ายประจำ	๑๒๓.๖๓	๘๕.๕๑	๖๔.๙๘	๕๒.๕๖

ขณะนี้ โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกกิจกรรม จำนวน ๕ โครงการ ยังคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งขณะนี้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การขอใช้เงินเหลือจ่าย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดจากการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๓๐,๔๖๘,๕๙๐ บาท โดยแยกเป็น ๒ กรณี

- กรณีไม่กระทบต่อแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

- กรณีกระทบต่อแผนฯ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๔๖๘,๕๙๐ บาท ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว ได้มีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๐๒๙,๕๙๐ บาท และไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,,๔๔๐,๐๐๐ บาท

การขออุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้รับการพิจารณาจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๔,๘๔๔,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งขออุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณที่จะขออุทธรณ์ จำนวน ๘,๓๔๑,๕๐๐ บาท

สรุปผลการออกติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน)

<u>อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน</u>

๑. ก่อสร้างบ้านแบบไทใหญ่ (บ้านไต) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทใหญ่ รองรับการท่องเที่ยว งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

<u>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</u>

๑. วัสดุในการสร้างบ้านเป็นเหล็ก ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ ที่สร้างบ้านจากไม้

๒. ไม่มีป้ายโครงการฯ

๓. ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว / แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

๔. ขอให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน









๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ระหว่างบ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอกจำแป่ ความยาวรวม ๓,๘๑๖ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๔๓๓,๔๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. ขอให้มีการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ
๒. ให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
๓. ให้มีการส่งมอบให้ อบต. หมอกจำแป่ เพื่อประโยชน์ในการดูแล และซ่อมบำรุง







๓. ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค บ้านทบศอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหมอกจำแป่ ความยาวรวม ๑,๖๔๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๑๔๙,๒๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. ขอให้มีการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ


๒. ให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

๓. ให้มีการส่งมอบให้ อบต. หมอกจำแป่ เพื่อประโยชน์ในการดูแล และซ่อมบำรุง

๔. ให้มีตระแกรง หรือวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง ปิดกั้นบ่อพักน้ำ / เก็บน้ำ ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพลัดตกลงไปในบ่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

๕. วาล์วปิด – เปิดน้ำ ให้ทำบ่อซีเมนต์ครอบ เพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วชำรุดเสียหาย



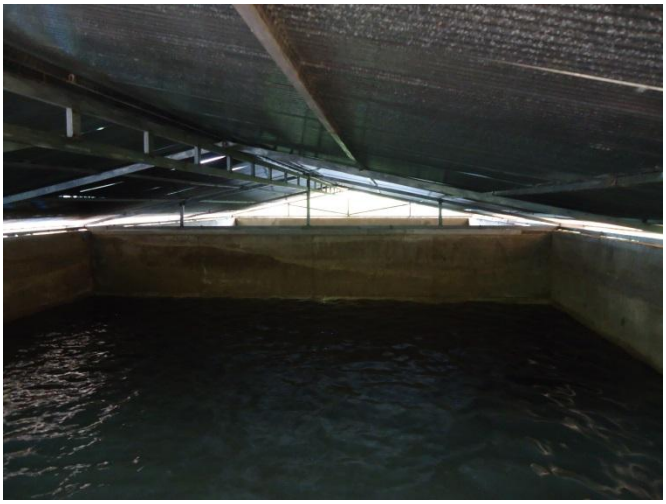





<u>อำเภอปางมะผ้า</u>

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านปางบอน (อาโจ้) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปู่ป้อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๓๗๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า

<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. การก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่เป็นไปตามแผนงาน

๒. แจ้งอำเภอปางมะผ้า ให้เร่งรัดผู้รับจ้าง

๓. ให้คำแนะนำการเก็บลูกปูนไว้ทดสอบ และการขอคืน ค่า K









<u>อำเภอปาย</u>

๑. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคนเดินปาย และในเขตเทศบาลตำบลเวียงใต้ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๒๕ เมตร ยาว ๑.๗๔๑ กิโลเมตร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. ให้คิดค่า K และทำเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K

๒. ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว









๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงใต้ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๘๔๖,๕๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. ดำเนินการเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว

๒. ให้ทำป้ายโครงการ

๓. ให้อำเภอ แจ้งอาคารที่กำลังก่อสร้างบริเวณดังกล่าว ไม่ให้เทเศษปูนลงรางระบายน้ำ เพราะจะให้ระบายน้ำไม่ได้









๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู จากโบสถ์คริสต์ – หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ งบประมาณ ๑,๔๓๖,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ:ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต</u>

๑. ให้คิดค่า K และทำเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K

๒. ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว









๔. ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร งบประมาณ ๕๖๗,๑๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต</u>

๑. ให้คิดค่า K และทำเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K

๒. ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว





๕. ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๙ เมตร งบประมาณ ๑,๑๖๘,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต</u>

๑. ให้คิดค่า K และทำเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K

๒. ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว





๖. ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ปิง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
<u>ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ</u>
๑. ออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
๒. ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับวงเงิน (ปริมาณงานมาก แต่วงเงินน้อย การก่อสร้างสามารถทำได้ แต่ไม่แข็งแรง)
๓. เนื่องจากถูกอุทกภัย ทำให้ท้ายฝายชำรุด ให้อำเภอ แจ้งผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร่งด่วน ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้













<u>อำเภอขุนยวม</u>

๑. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง มส.ถ ๑ – ๐๐๑๑ บ้านหัวปอน – บ้านมะหินหลวง ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม ขนาดกว่าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๔๘๐ กิโลเมตร

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม

<u>ปัญหา/ข้อแนะนำ / ข้อเสนอแนะ</u>

๑. การก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่เป็นไปตามแผนงาน

๒. ให้อำเภอขุนยวมเร่งรัดผู้รับจ้าง

๓. การก่อสร้างลำลาง ไม่มีคุณภาพ ชำรุดตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง (ส่วนผสมปูนไม่ได้คุณภาพ)

๔. ให้อำเภอขุนยวม แจ้งผู้รับจ้าง รื้อ ทุบ ลำลาง จุดหรือบริเวณ ที่ไม่มีคุณภาพ แล้วสร้างใหม่ ให้ถูกต้องตามแบบแปลน และมีคุณภาพ

๕. ไม่มีผู้ควบคุมงานของบริษัท และ อบจ. คอยควบคุมงาน ทำให้งานที่ออกมา ไม่มีคุณภาพ













๒. ปรับปรุงถนนลาดยาง (มส ๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ – บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม– ต.แม่เงา อ.ขุนยวม งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

<u>ข้อแนะนำ / ข้อเสนอแนะ</u>

๑.สัญญาเริ่ม ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. อยู่ระหว่างก่อสร้างลำลางระบายน้ำ

๓. อยู่ระหว่างการปรับฟื้นผิวทาง เพื่อรอการลาดยางแอสฟัทติกคอนกรีต

๔. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐









<u>อำเภอแม่ลาน้อย</u>

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์อำนวยการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย งบประมาณ ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>

๑. การดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ

๒. ไม่มีป้ายโครงการ

๒. ผู้รับจ้าง ไม่ได้เบิกตามงวดงาน แต่เบิกงวดเดียว ทั้งหมดเลย









๒. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่ลาน้อย งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>


๑. การออกแบบอาคารไม่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

๒. บันได ขึ้นชั้น ๒ (ดาดฟ้า) ไม่มีความแข็งแรง ให้ทำเหล็กยึด เสริมให้แข็งแรง เพราะเกิดความเสี่ยงที่บันไดจะหลุดออกได้

๓. การเบิกเงินไม่ตามงวดงาน ผู้รับจ้างเบิกงวดเดียว ทั้งหมดเลย

๔. ห้องน้ำชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แก้ไขปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดี(ห้องน้ำเดิม)



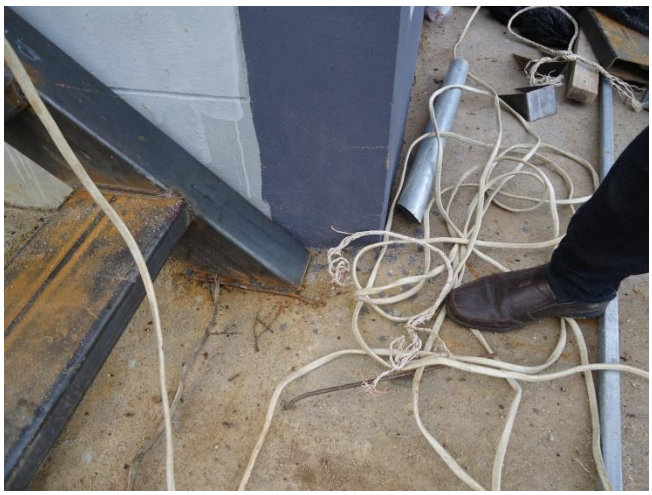




<u>อำเภอแม่สะเรียง</u>

๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มส. ถ ๑ – ๐๐๐๕ บ้านท่าข้าม – บ้านเสาหิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>

๑. ให้ส่งมอบงาน ตามงวดงาน

๒. ให้ติดป้ายโครงการ









๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ตำบลแม่เหาะ งบประมาณ ๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง
<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>

๑. ให้ส่งมอบงาน ตามงวดงาน

๒. ให้ติดป้ายโครงการ

๓. การเทปูน ที่ติดกับพื้น ให้หาวัสดุรอง เพื่อให้โครงเหล็กอยู่ในปูน (ปูนหุ้มเหล็ก)









๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เหาะ ขนาดกว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง

<u>ข้อเสนอ / ข้อแนะนำ</u>

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว

๒. ติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย





อำเภอสบเมย

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยพุยโค บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่คะตวน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย

<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว

๒. ให้ติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย









๒. ก่อสร้างถนน คสล. มส ๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย
งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
<u>ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนำ</u>
๑. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒. ให้เบิกจ่ายตามงวดงาน
๓. ให้ติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย







<u>ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา</u>

๑) พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเขตป่าสงวน ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีโครงการไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ หรือตรวจสอบพื้นที่การดำเนินงานก่อนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หรือหน่วยงานใด ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวได้ จังหวัดจึงแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่สำรวจพื้นที่ให้ชัดเจนแล้วสั่งการให้หน่วยงานยื่นขอใช้พื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ จังหวัดได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ไปยังกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ รายการ งบประมาณ ๑๒๓,๐๑๔,๖๐๐ บาท ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการแล้ว จำนวน ๒๗ รายการงบประมาณ ๑๒๐,๗๖๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดได้แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๒) ราคากลางสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์บางรายการ และน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีราคาสูงกว่าราคากลางปรกติ จึงทำให้การจัดหาครุภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการได้หรือการจัดซื้อ – จัดจ้างบางโครงการ / กิจกรรมต้องมีประกาศหาผู้รับจ้าง ๒ – ๓ ครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้าง และบางครั้งก็ไม่มีผู้มาเสนอราคา

๓) บางกิจกรรมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และแบบแปลนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการในช่วงแรกล่าช้า

๔) สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ลาดชัน ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางโครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝน การคมนาคมขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อดำเนินการในพื้นที่ เป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้เกิดความล่าช้า

๕) ผู้รับจ้างบางรายรับงานจำนวนหลายโครงการ ซึ่งมีปัญหาการขาดบุคลากร หรือมีการมอบให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการแทน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การดำเนินงานไปเป็นไปตามแผนงานและงวดงานที่กำหนดไว้

<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>

๑) ในการจัดทำแผนงานโครงการที่รายการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ต้องมีแบบแปลน / มีแบบประมาณการราคา (ปร.๔/ปร.๕) / ความพร้อมด้านสถานที่ และสามารถดำเนินการได้ทันที

๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ควรผ่อนปรนหรืออนุญาตให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดพื้นที่พิเศษ สามารถดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และเหมาะสมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ได้ หรือควรมีการกำหนดห้วงเวลาในการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ให้ชัดเจนและควรพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วแจ้งผลให้จังหวัดทราบ

๓) หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานราคากลางของกรมบัญชีกลางและของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้กับทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและห่างไกลจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ จึงควรให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถกำหนดราคากลางของสินค้าได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่

๔) ส่วนกลางทุกกระทรวง กรม ควรพิจารณาบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

๕) เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในหมวดงบลงทุนสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการ กำชับสั่งการให้ช่างควบคุมงานต้องควบคุมการเข้าทำงานของผู้รับจ้างอย่างเข้มงวด และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

****
